


建設予定地付近杭打データ（余目保健センター）

PAGE

杭 打 試 験 記 録 表

打込月日	56年8月20日	打込番号	1	伏図番号	47
使用杭	φ 350 mm × (13 + 12) m	最終沈下量	4 mm	支持力	ton
杭貫入量	25.8 m	リバンド量	mm	落下高	1.8 m
打込機	D-308SA型	ハンマー	IDH-22	備考	ヤットコ 20%減, 落接 5%減
総打撃回数	348 回				

深 度 (m)	各打撃数 (回)	総打撃数 (回)
0 - 1		
1 - 2		
2 - 3		自
3 - 4		
4 - 5		
5 - 6		沈
6 - 7		
7 - 8		
8 - 9		↓
9 - 10	3	3
10 - 11	1	4
11 - 12	7	10
12 - 13	12	22
13 - 14	8	30
14 - 15	6	36
15 - 16	3	39
16 - 17	6	45
17 - 18	11	56
18 - 19	31	87
19 - 20	17	104
20 - 21	23	127
21 - 22	25	152
22 - 23	21	173
23 - 24	26	199
24 - 25	50	249
25 - 26	99	348
26 - 27		
27 - 28		
28 - 29		
29 - 30		
30 - 31		
31 - 32		
32 - 33		
33 - 34		
34 - 35		

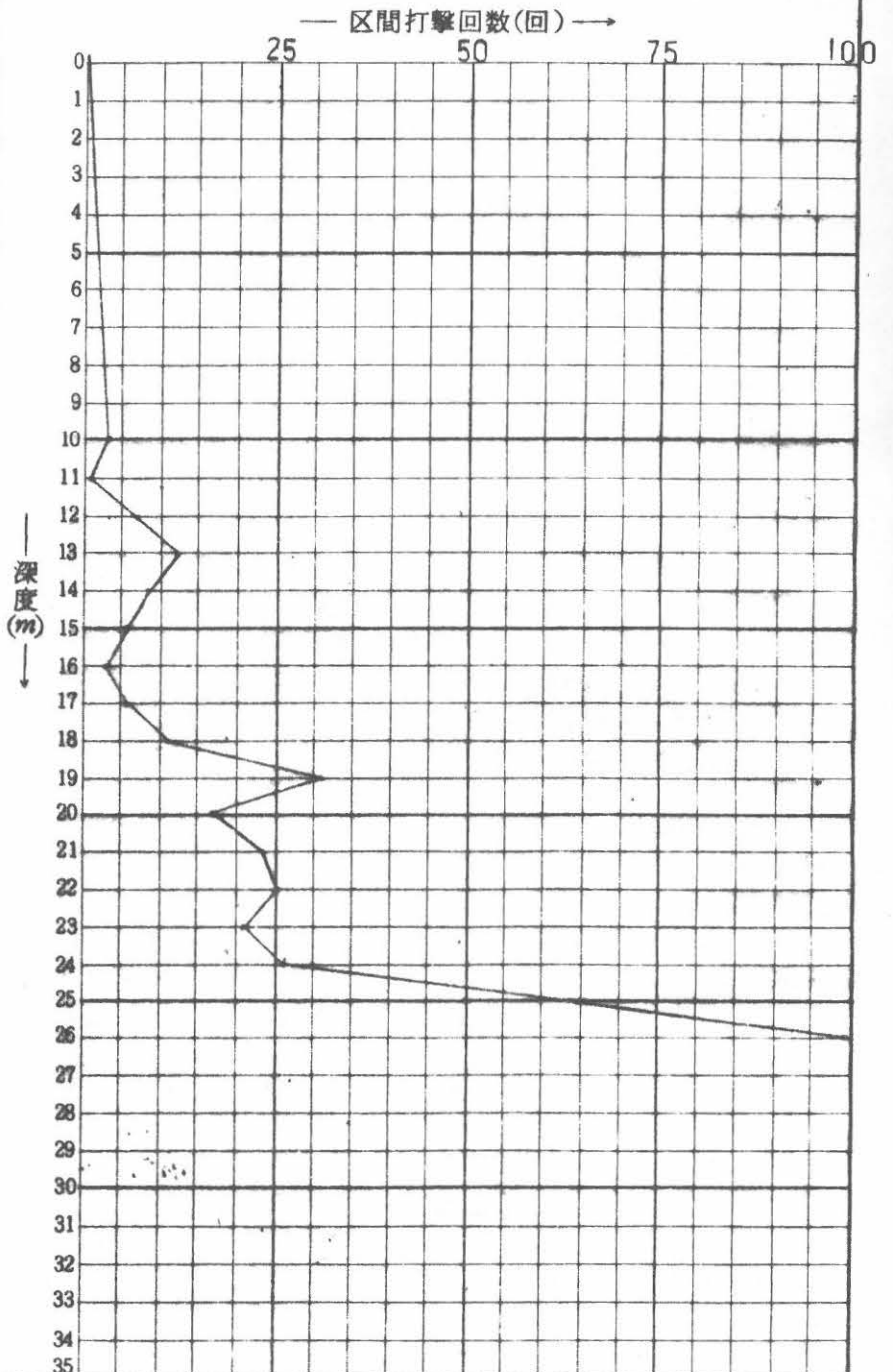

杭打試験記録表

打込月日	56年8月20日	打込番号	2	伏図番号	19
使用杭	φ350 mm × (13+12) mm			最終沈下量	2 mm
杭貫入量	25.6 m	リバンド量	mm	支持力	54.0 ton
打込機	D308SA型	ハンマー	IDH-22	落下高	1.8 m
総打撃回数	332 回	備考	ヤットコ 20% 減、溶接 5% 減		

深 度 (m)	各打撃数 (回)	総打撃数 (回)
0 - 1		
1 - 2		
2 - 3		自
3 - 4		
4 - 5		
5 - 6		
6 - 7		沈
7 - 8		
8 - 9		
9 - 10		↓
10 - 11	1	1
11 - 12	3	4
12 - 13	1	5
13 - 14	9	14
14 - 15	17	31
15 - 16	11	43
16 - 17	17	60
17 - 18	22	82
18 - 19	25	107
19 - 20	17	124
20 - 21	16	140
21 - 22	16	156
22 - 23	36	192
23 - 24	28	220
24 - 25	49	269
25 - 26	63	332
26 - 27		
27 - 28		
28 - 29		
29 - 30		
30 - 31		
31 - 32		
32 - 33		
33 - 34		
34 - 35		

